








































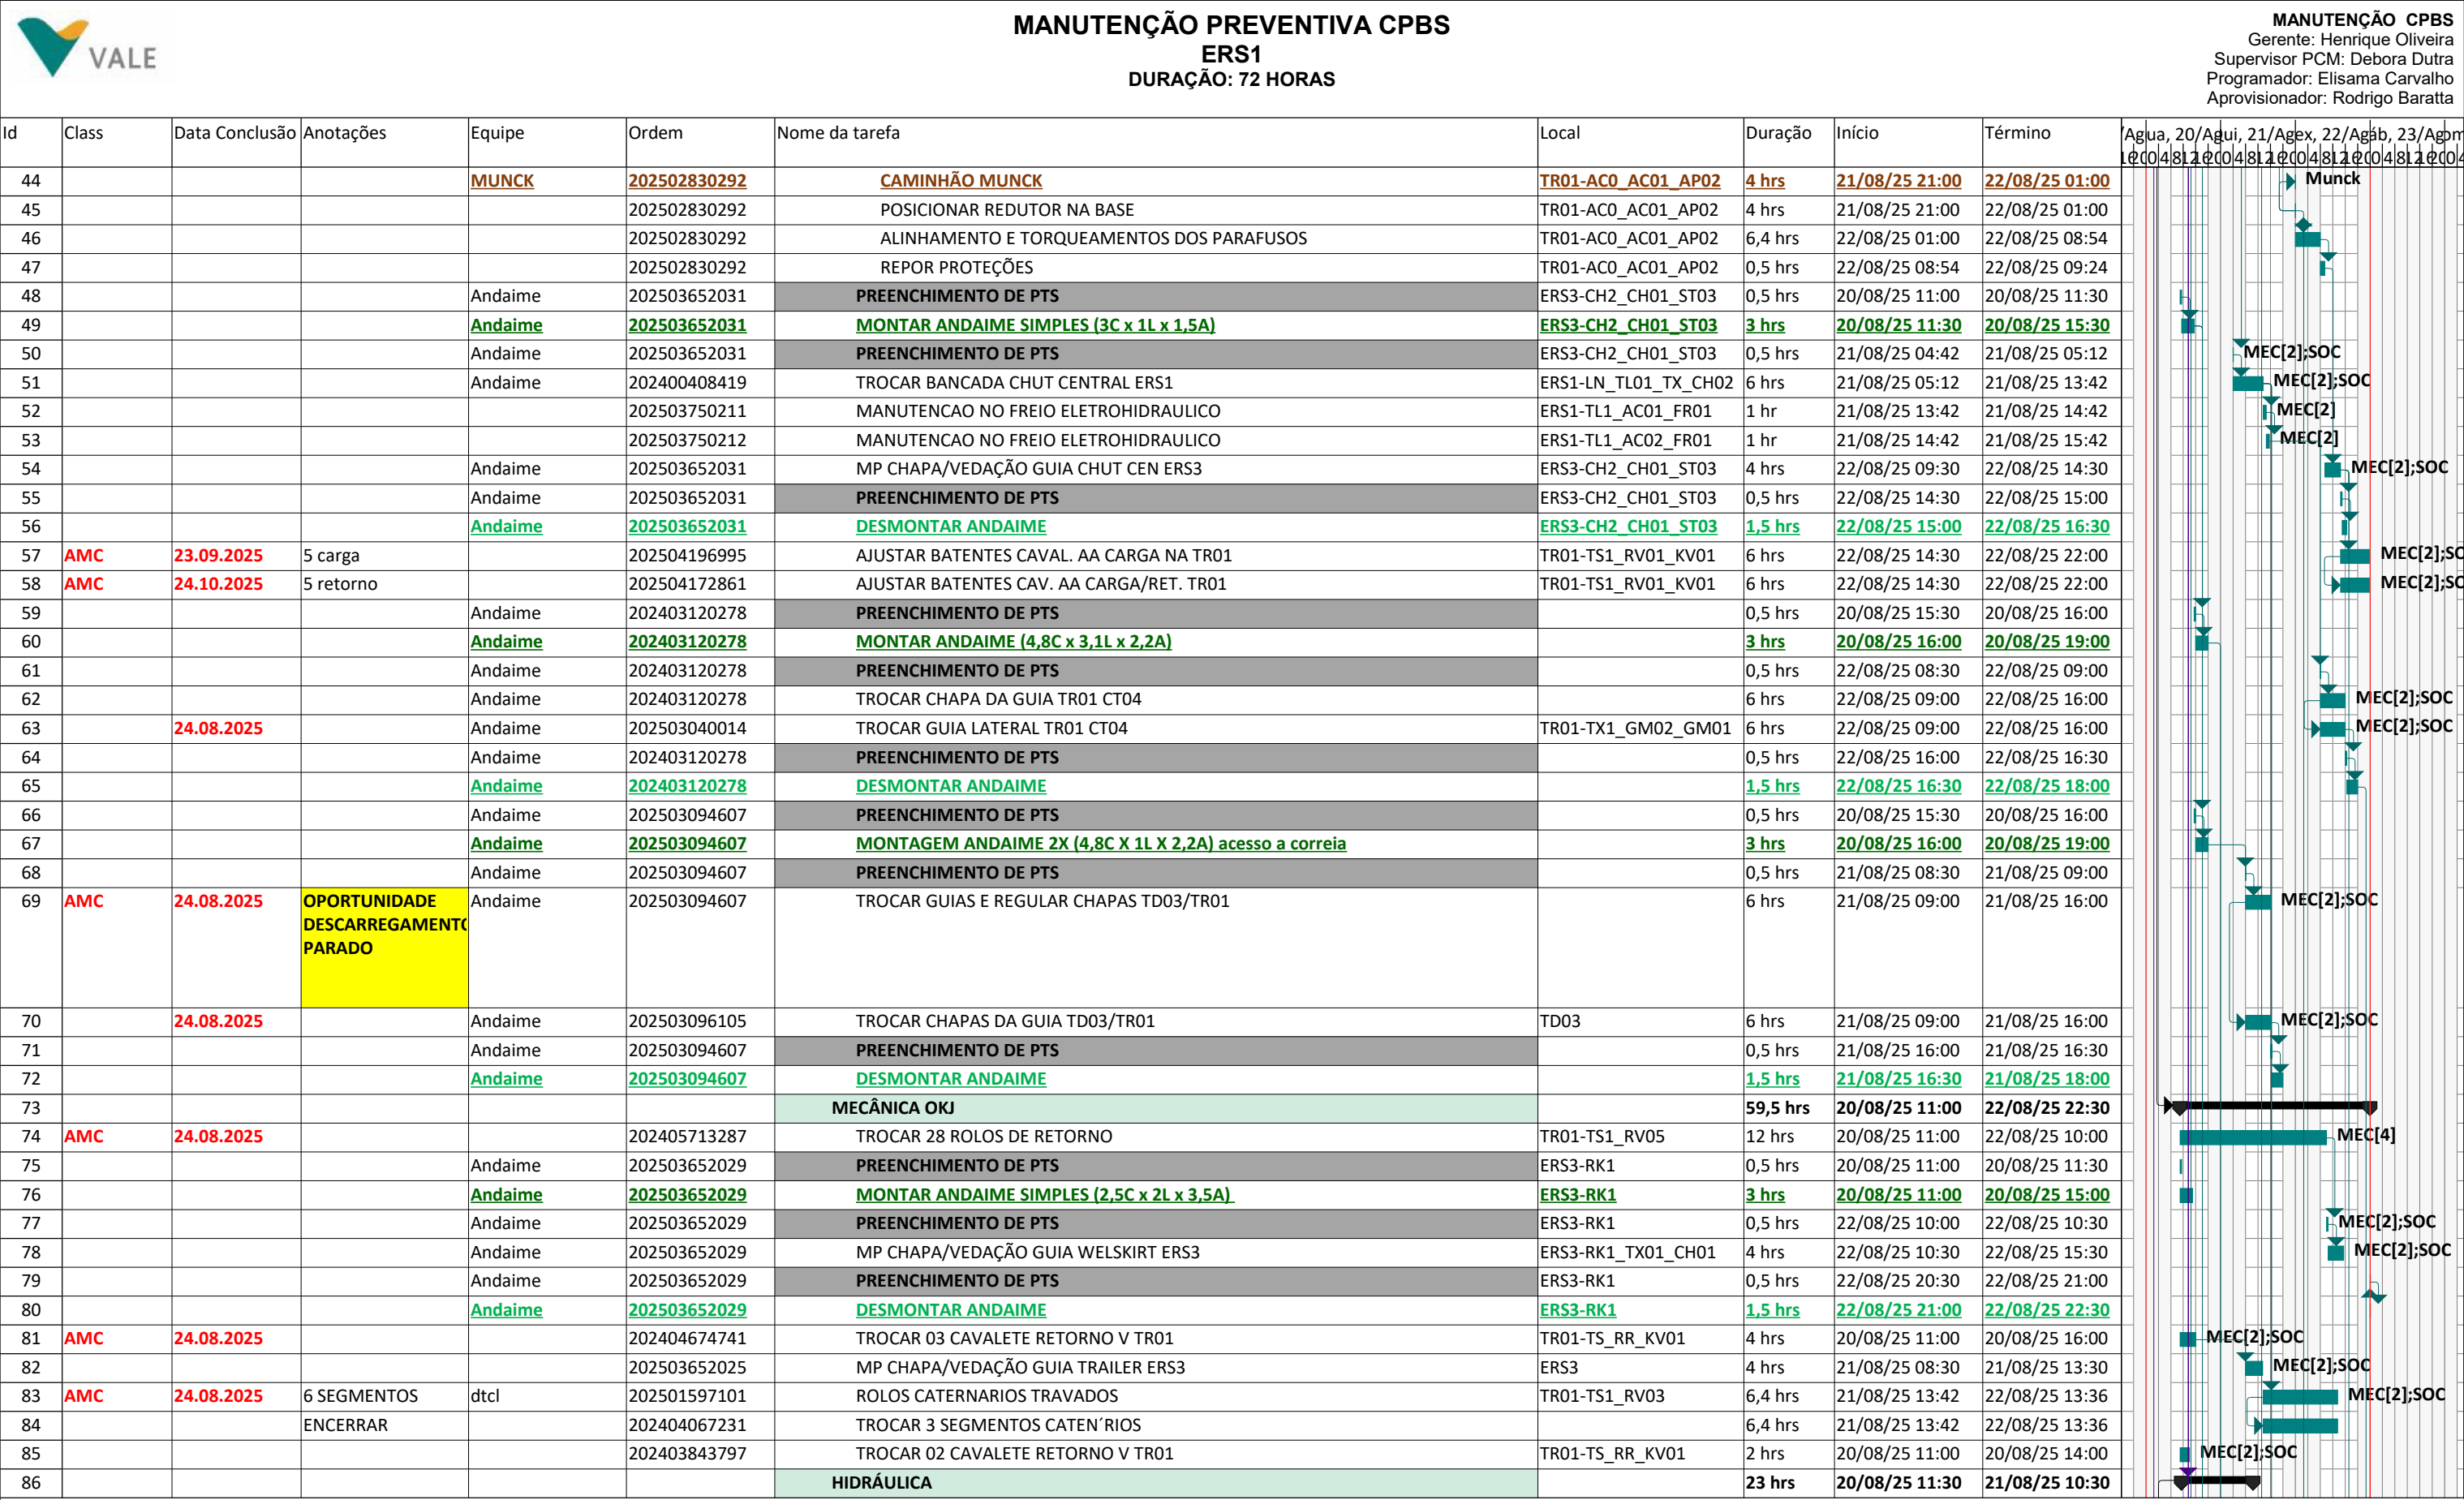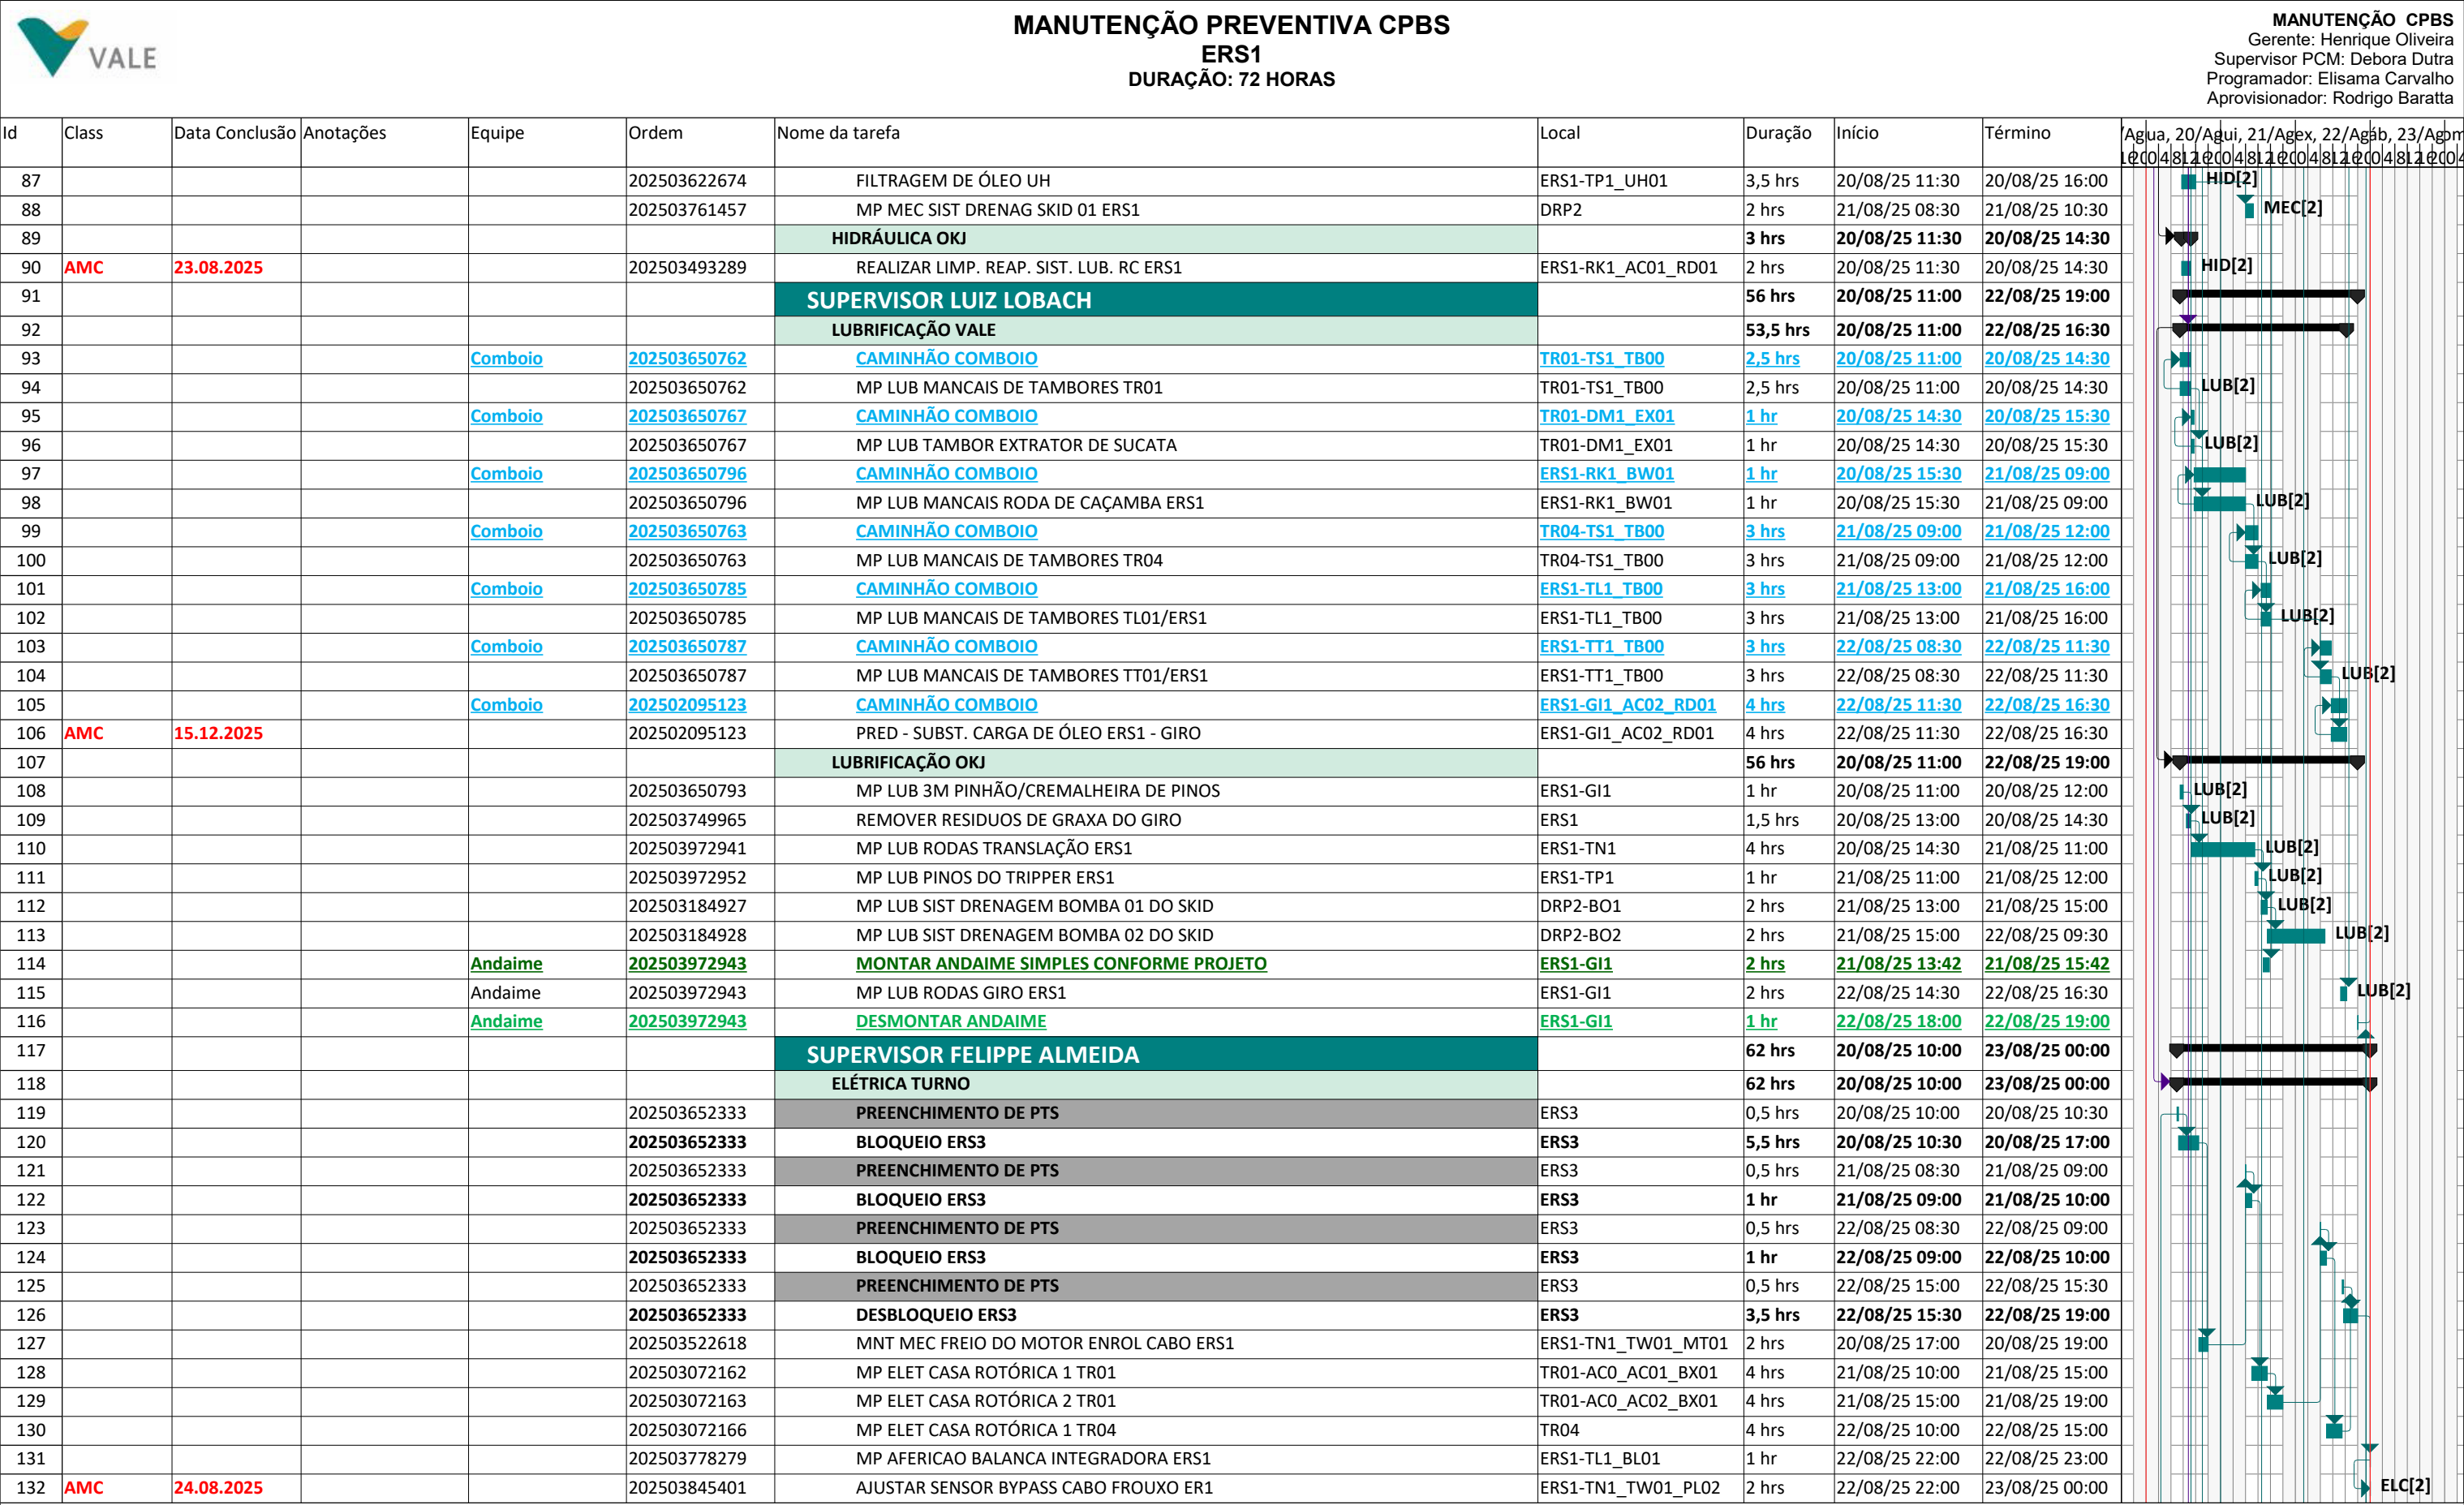























Etapa da Linha de Base		Rolled Up Task		Progress		Etapa Inativa		Somente início	
Task		Rolled Up Milestone		Baseline		Resumo Inativo		Somente término	
Baseline		Baseline Summary		Milestone		Tarefa Manual		Progress	
Milestone		Rolled Up Baseline		Baseline Milestone		Somente duração		Rolled Up Task	
Baseline Milestone		Rolled Up Baseline Milestone		Summary		Acúmulo de Resumo Manual			
Summary		Rolled Up ProgTask		Tarefa Inativa		Resumo Manual			








Etapa da Linha de Base		Rolled Up Task		Progress		Etapa Inativa		Somente início	
Task		Rolled Up Milestone		Baseline		Resumo Inativo		Somente término	
Baseline		Baseline Summary		Milestone		Tarefa Manual		Progress	
Milestone		Rolled Up Baseline		Baseline Milestone		Somente duração		Rolled Up Task	
Baseline Milestone		Rolled Up Baseline Milestone		Summary		Acúmulo de Resumo Manual			
Summary		Rolled Up ProgTask		Tarefa Inativa		Resumo Manual			




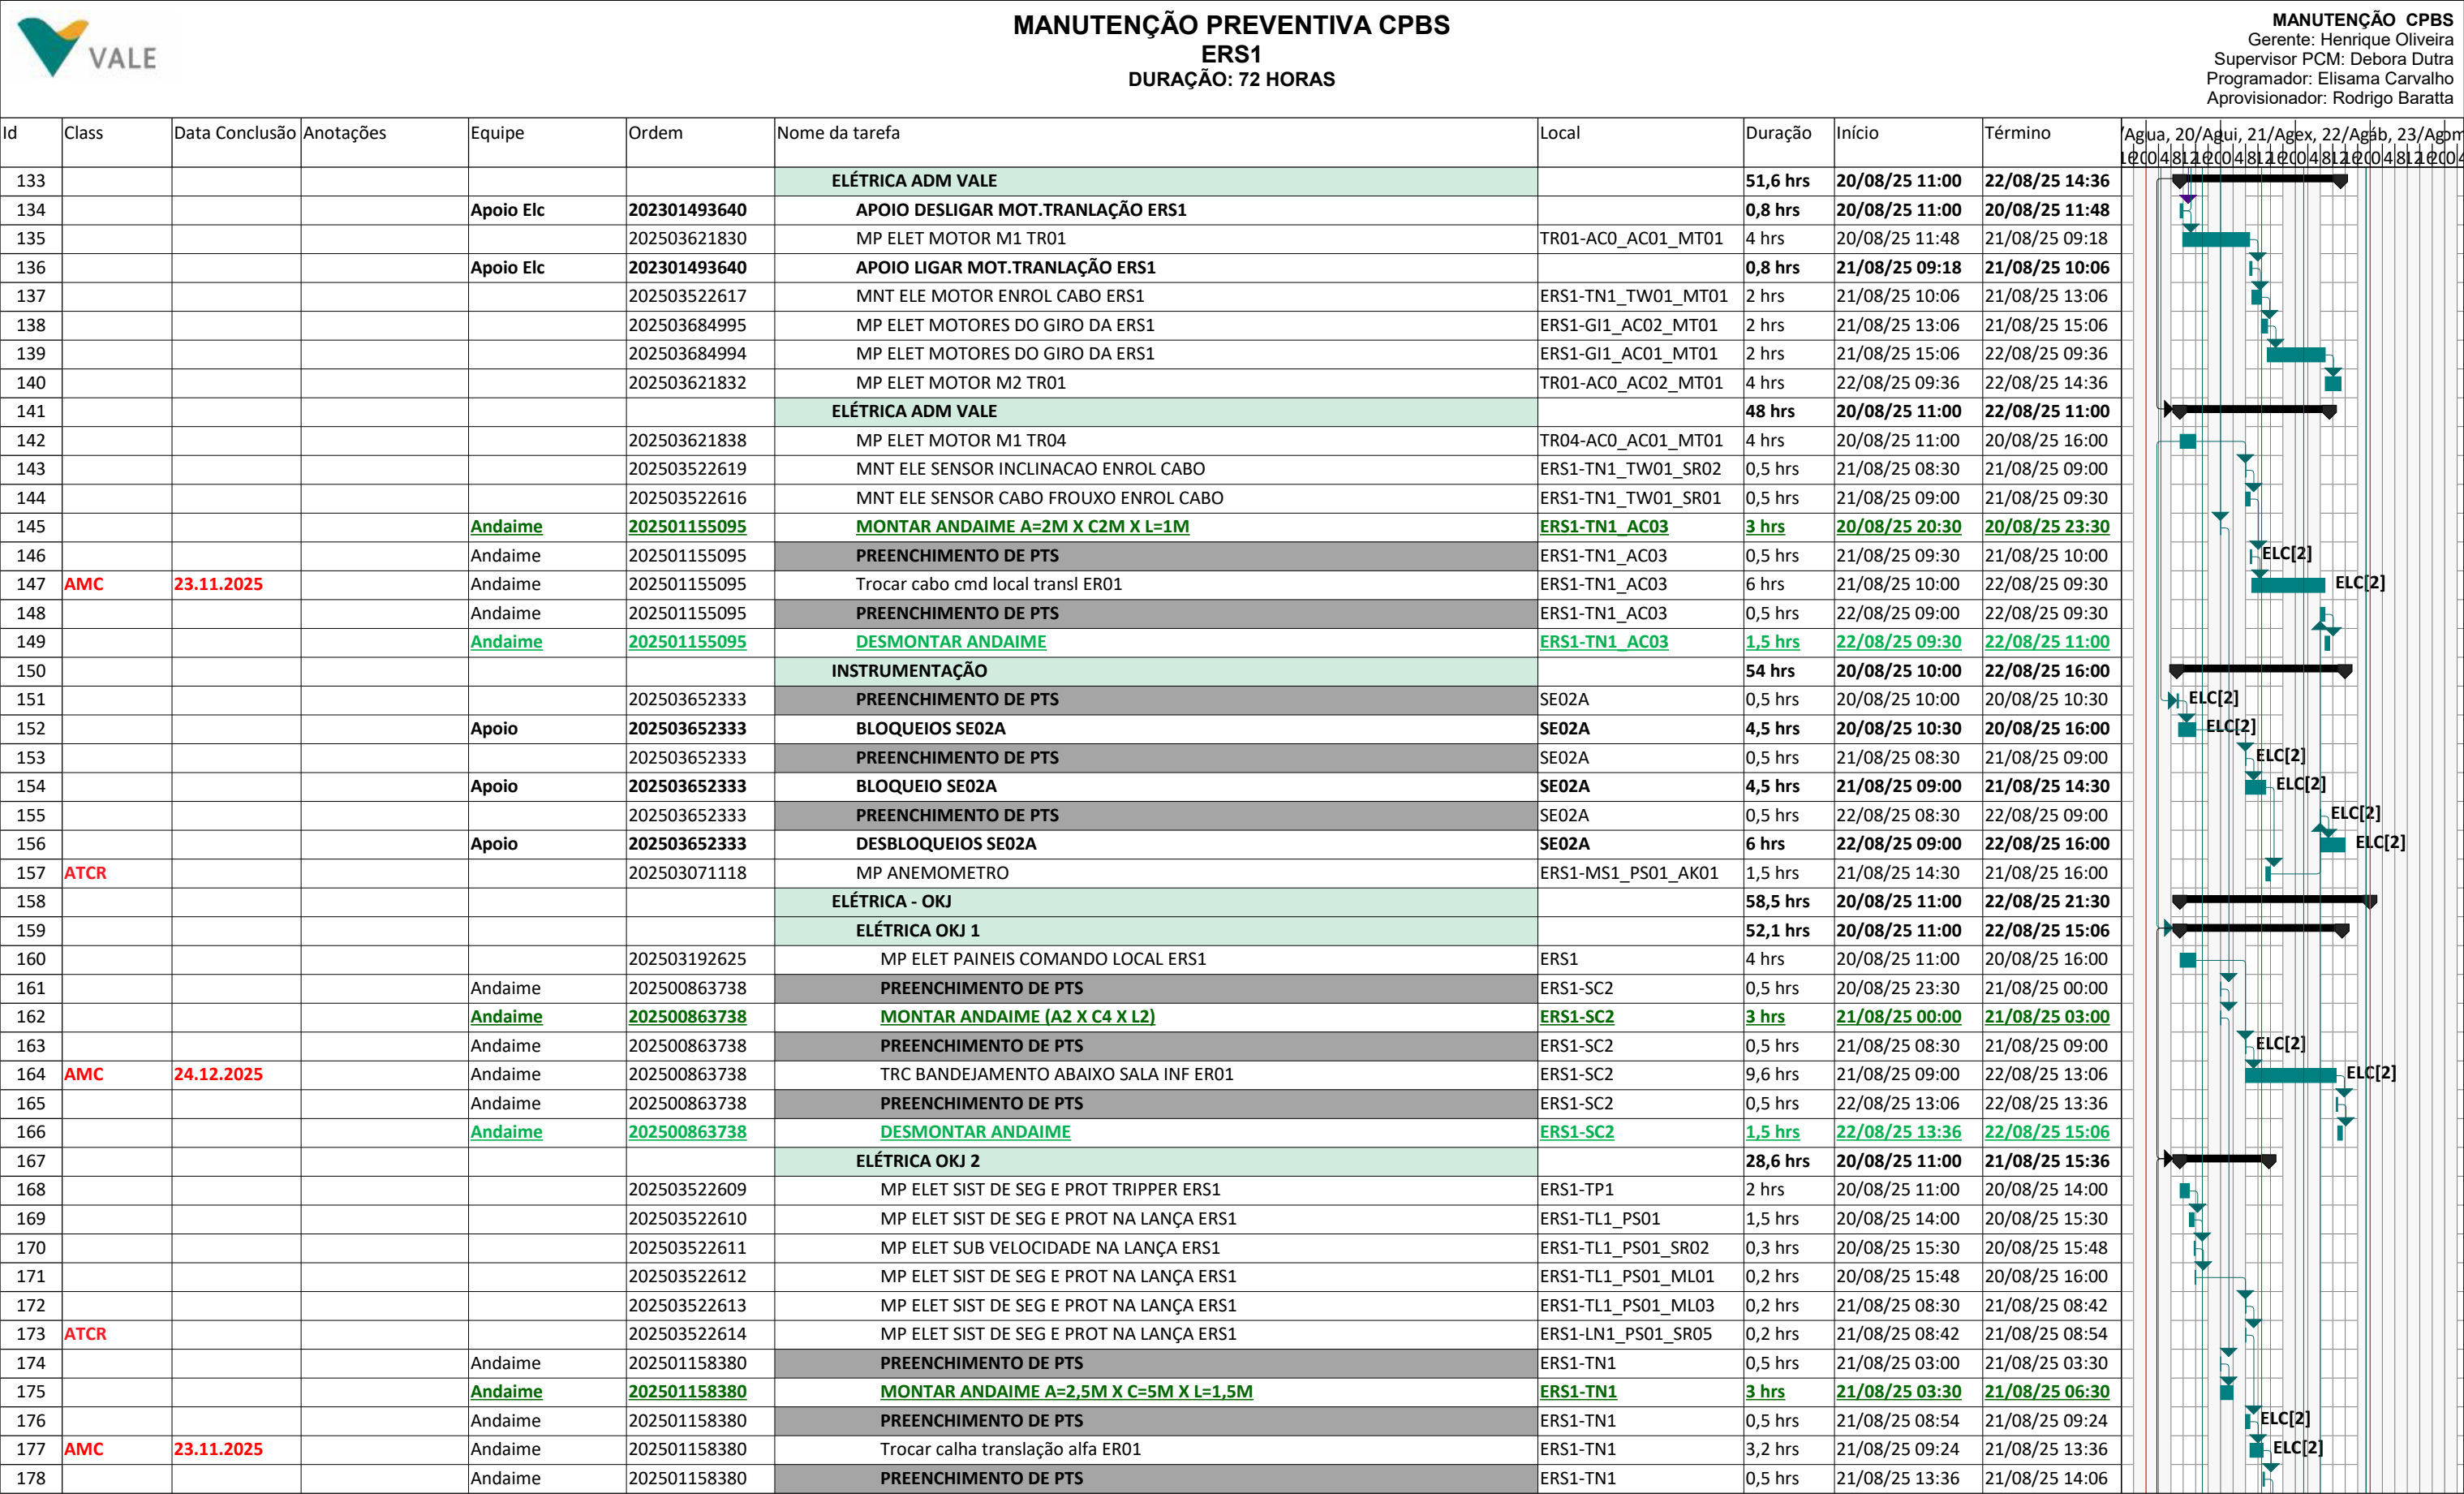

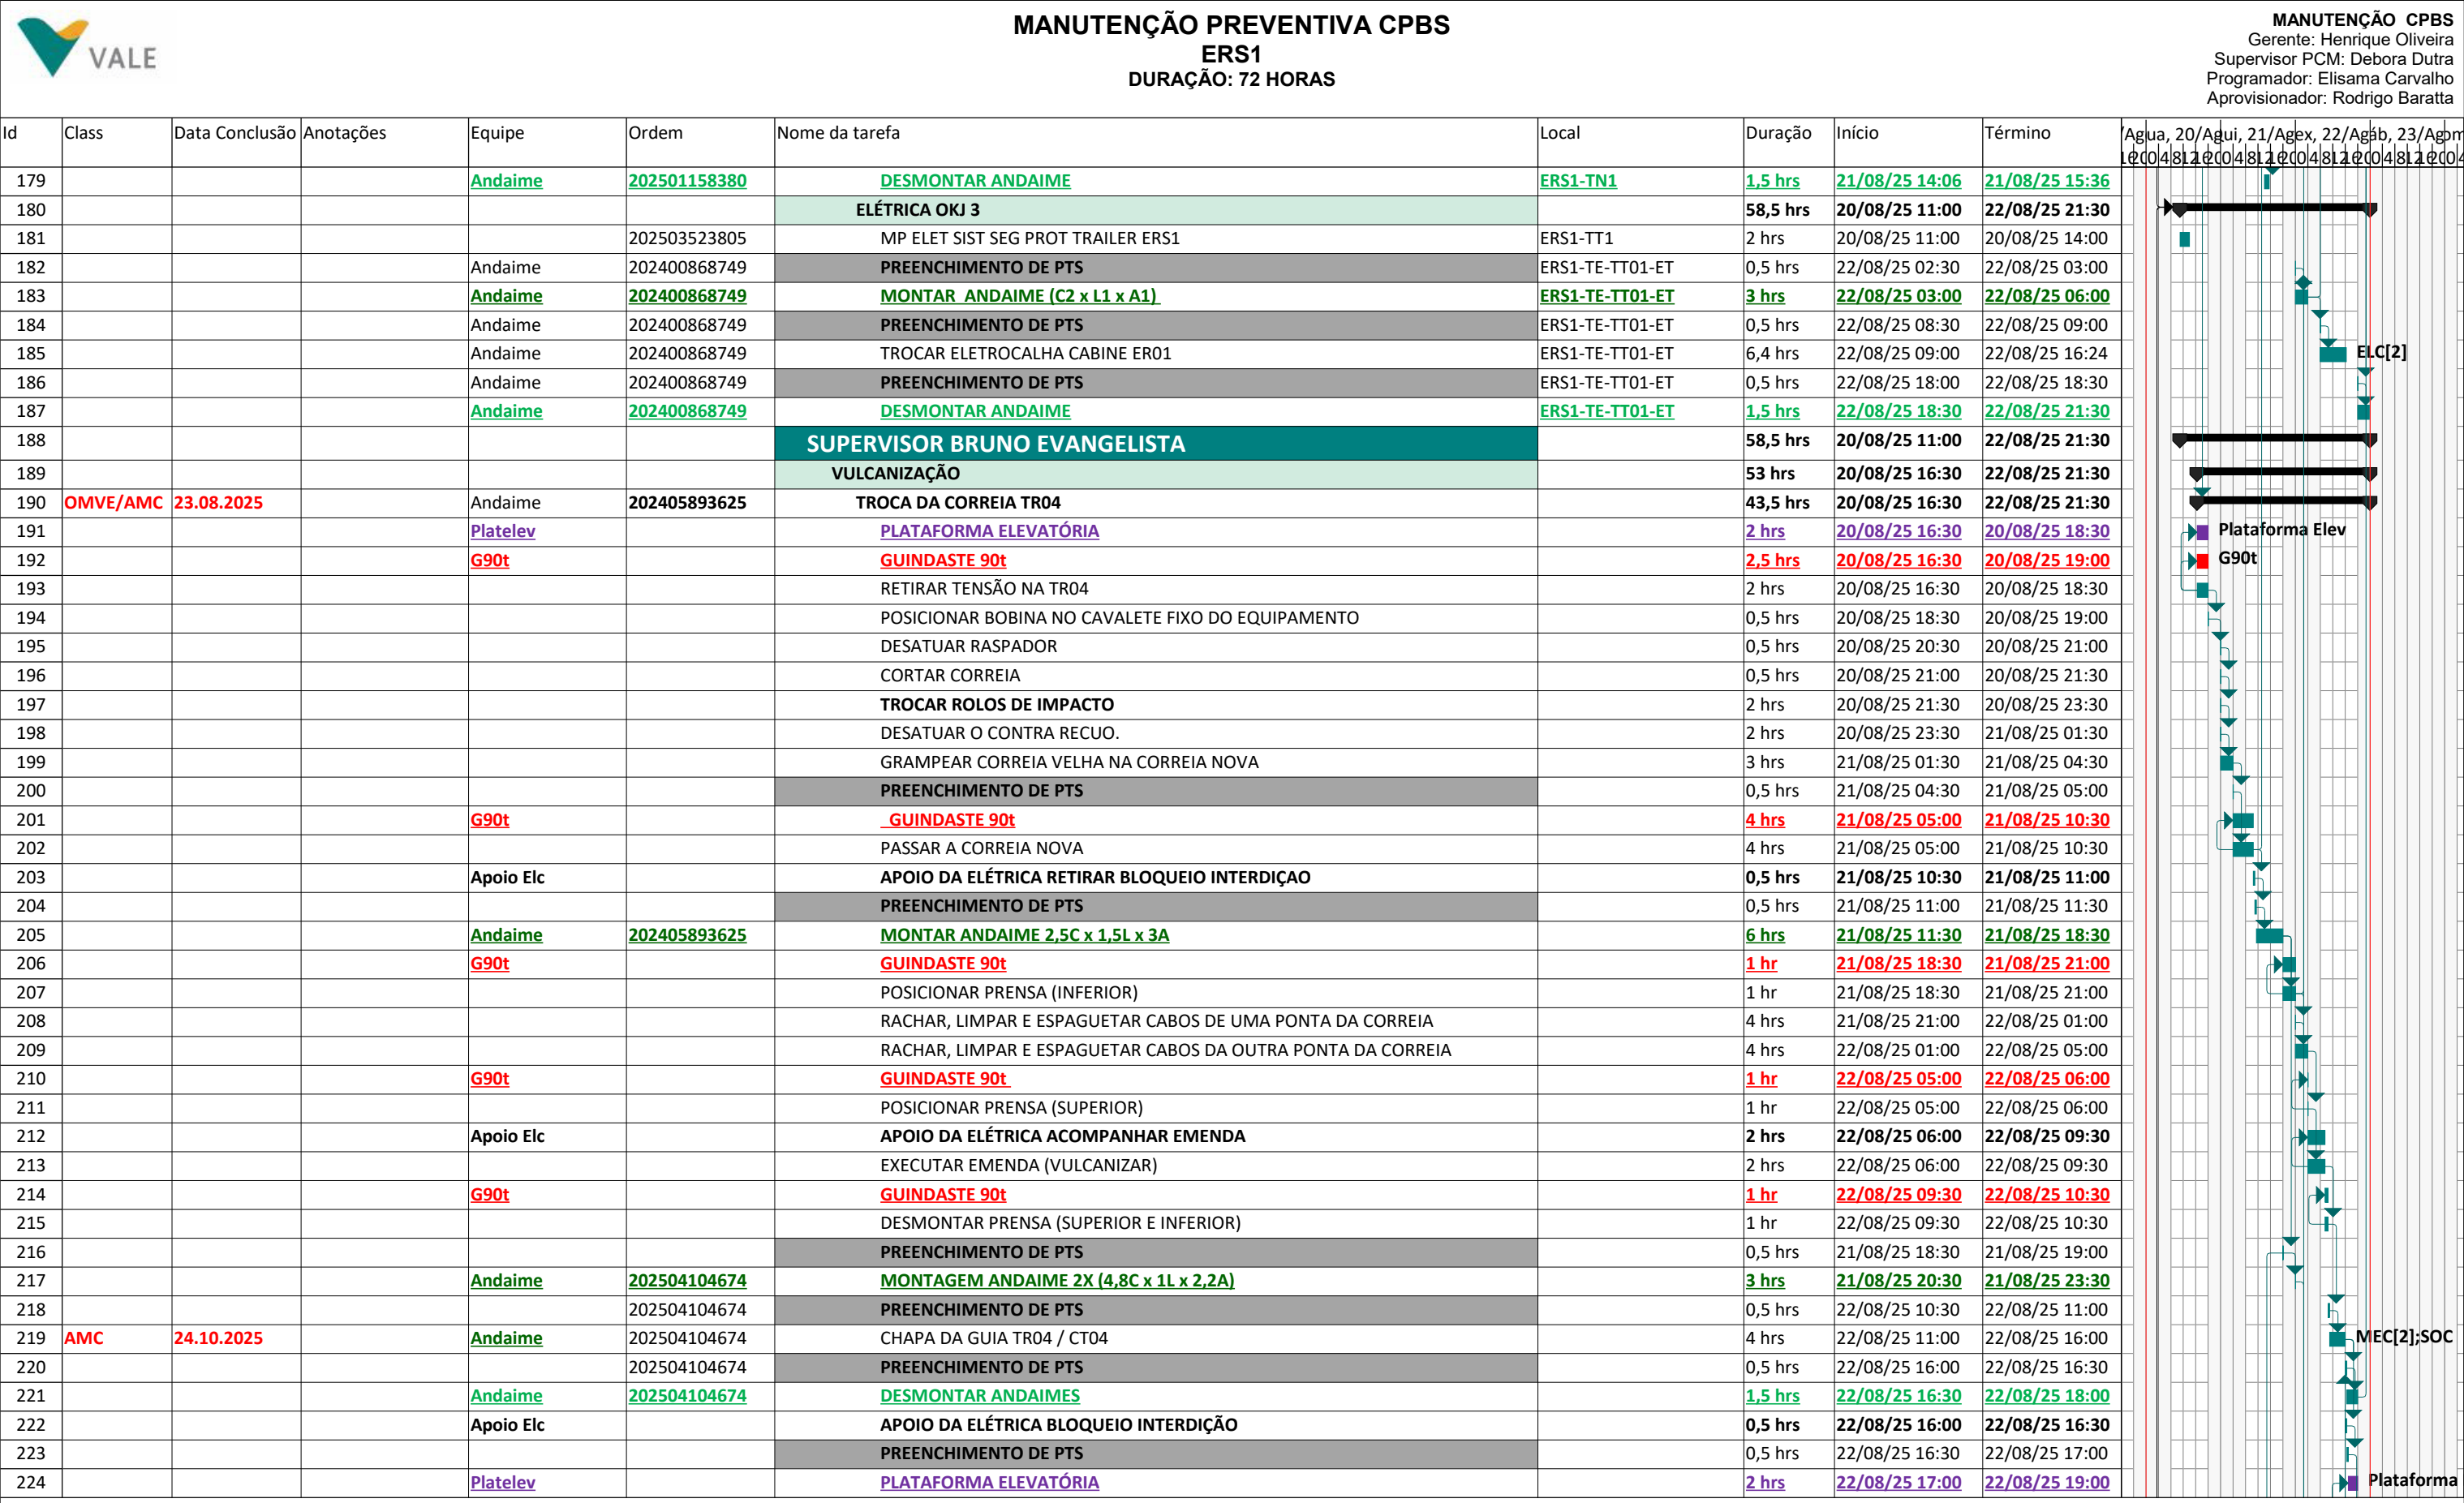

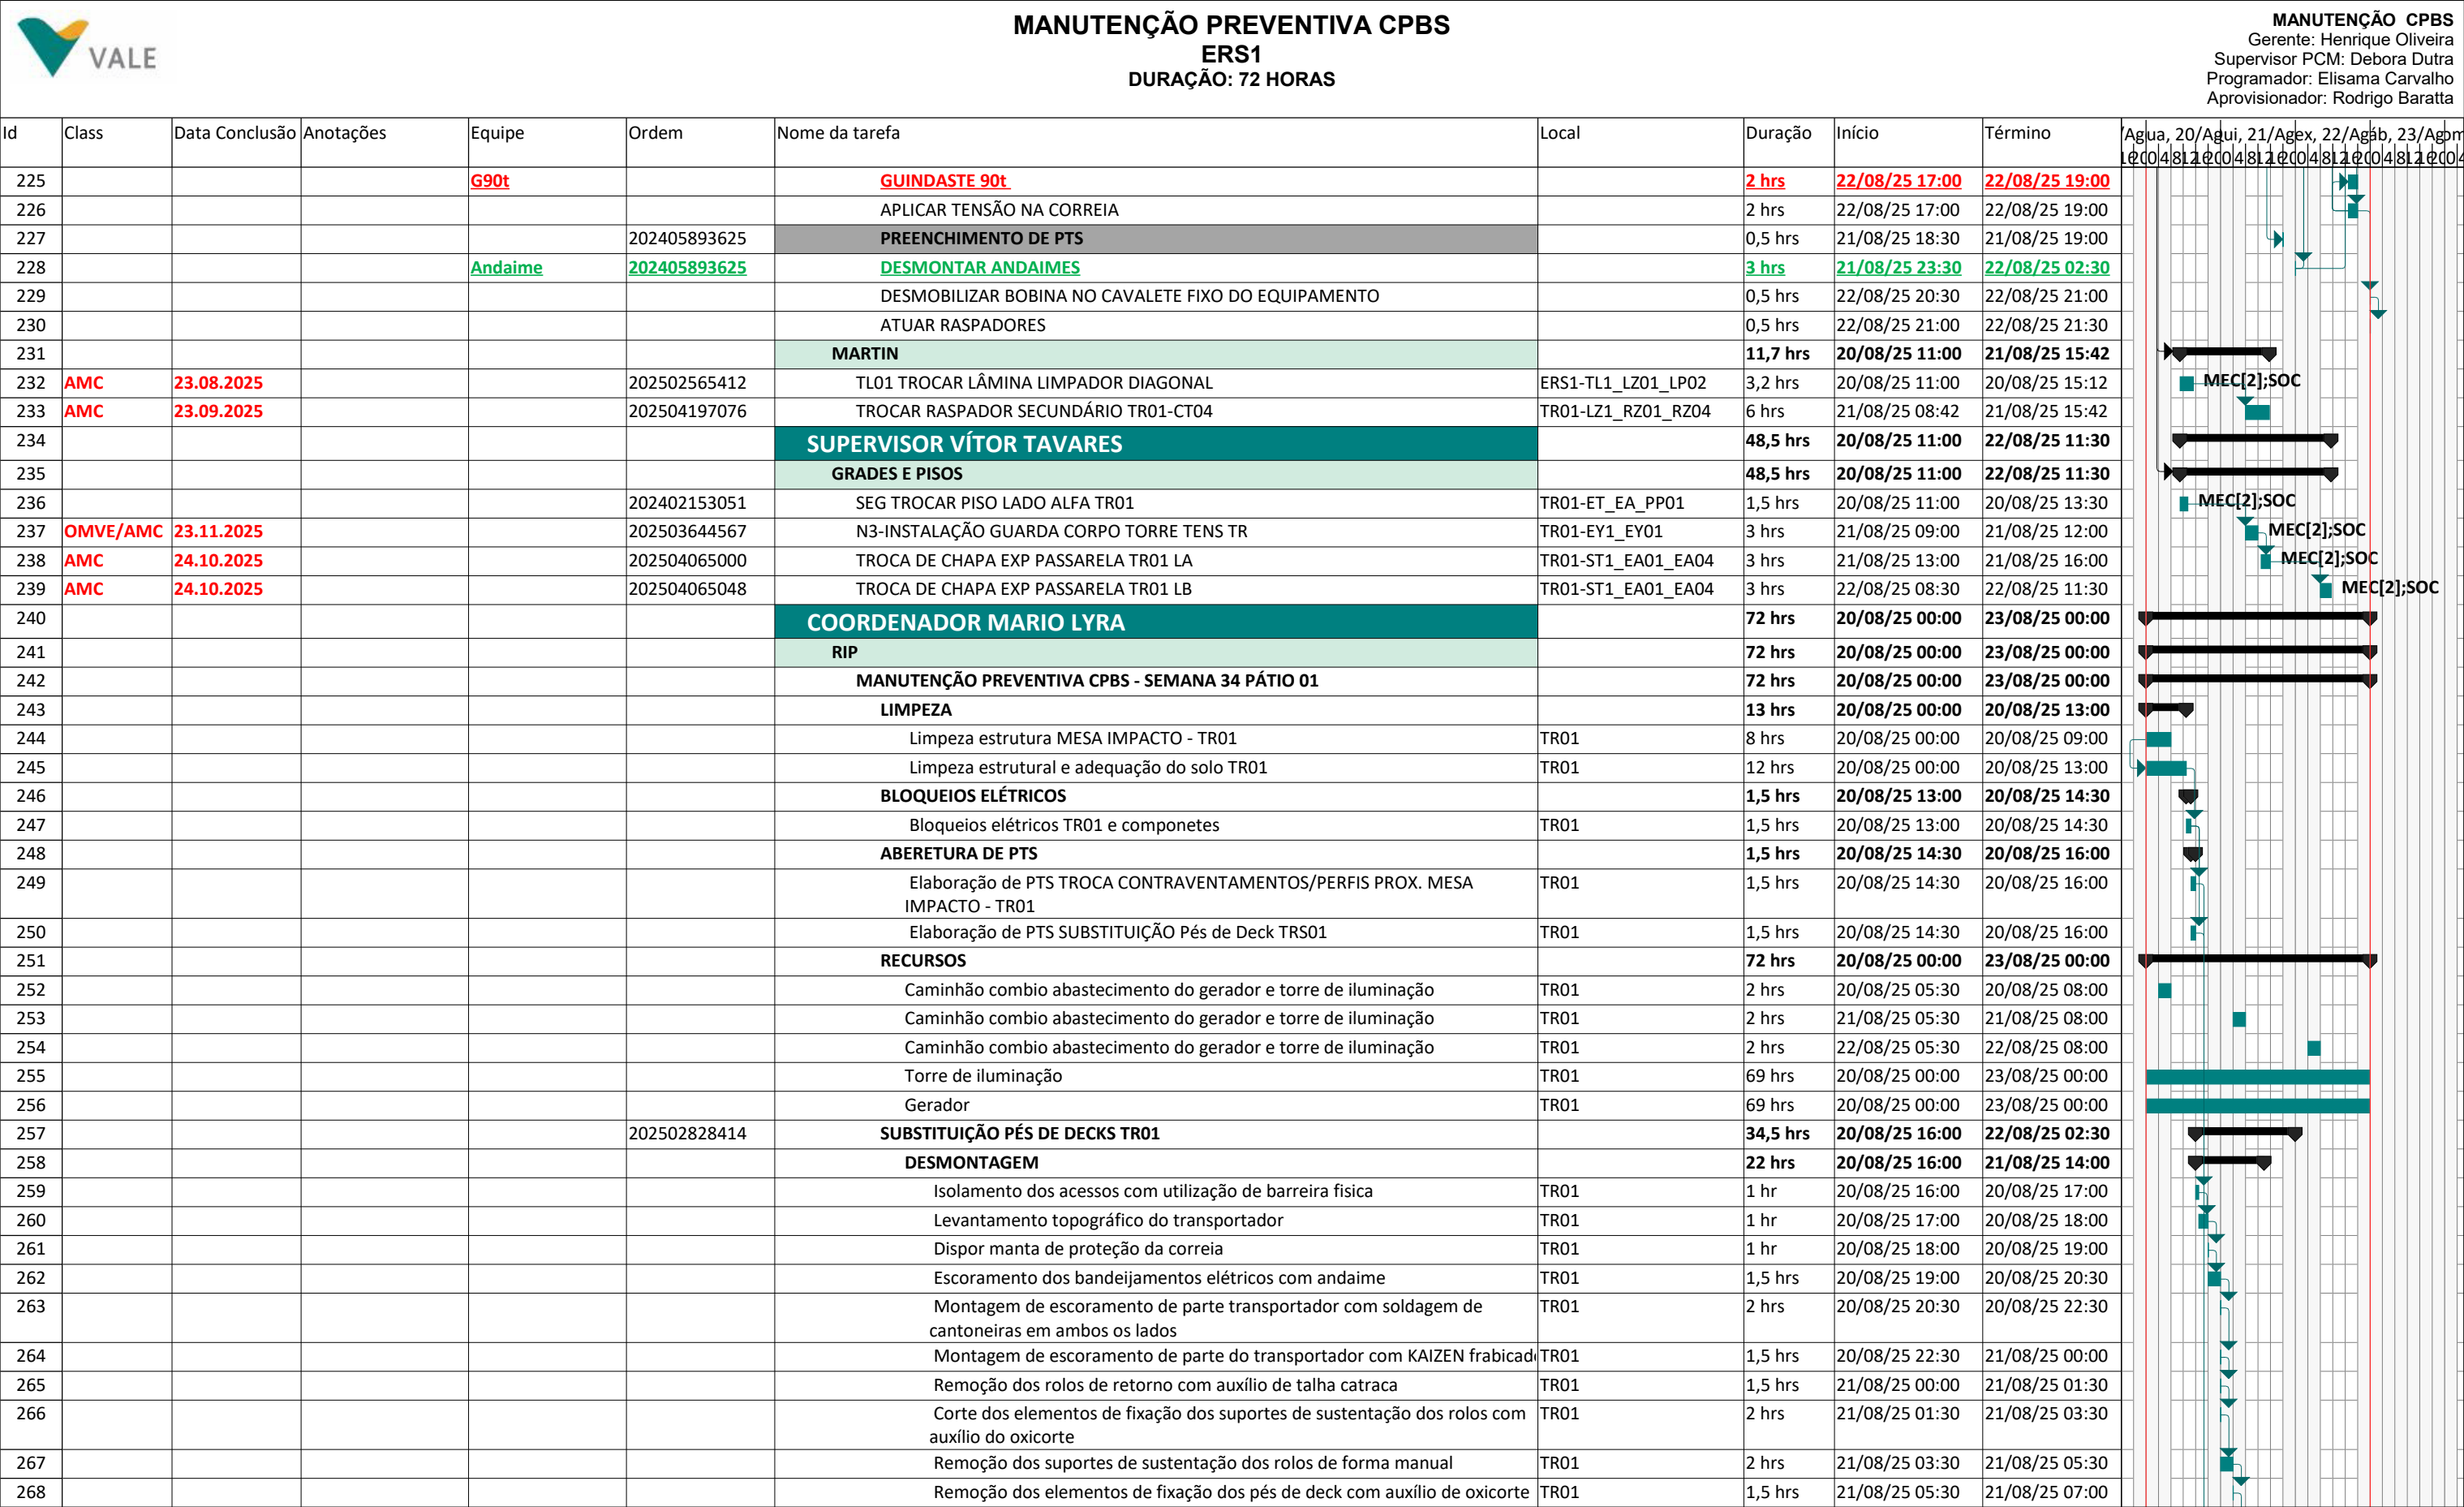



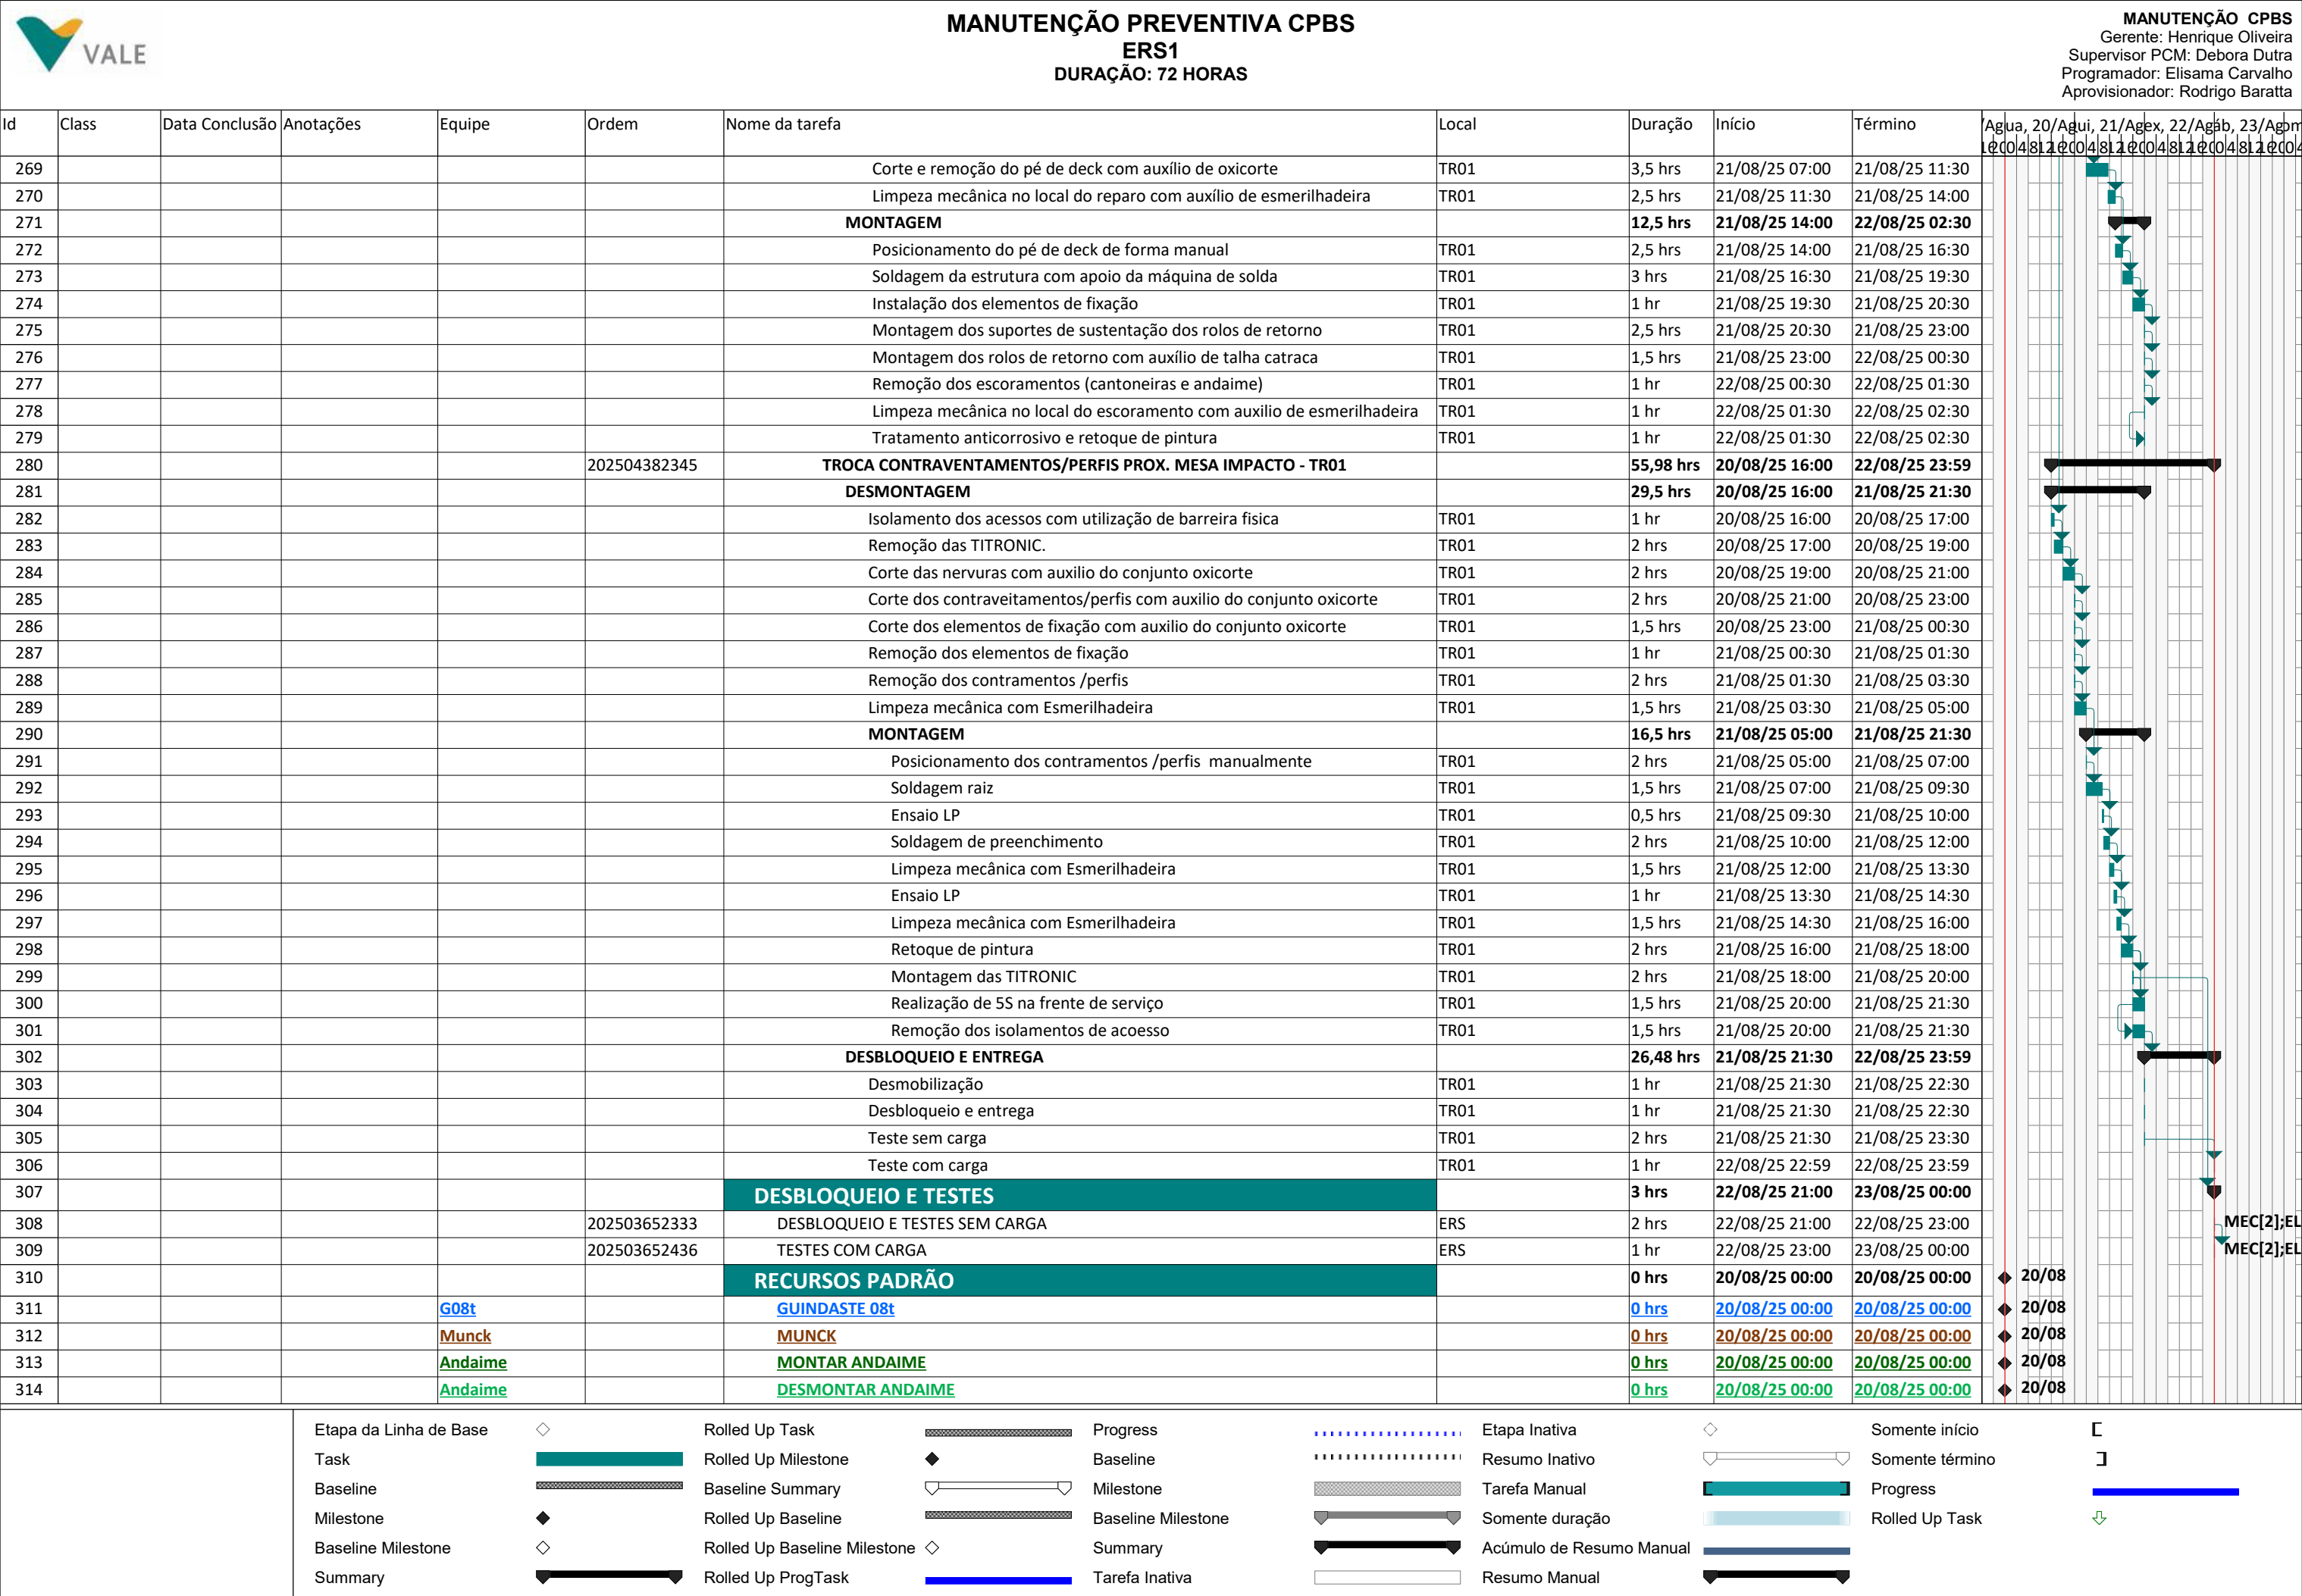




MANUTENÇÃO PREVENTIVA CPBS

ERS1

DURAÇÃO: 72 HORAS

MANUTENÇÃO CPBS

Gerente: Henrique Oliveira

Supervisor PCM: Debora Dutra

Programador: Elisama Carvalho

Aprovisionador: Rodrigo Baratta

Id	Class	Data Conclusão	Anotações	Equipe	Ordem	Nome da tarefa	Local	Duração	Início	Término	Agua, 20/Agui, 21/Agex, 22/Agáb, 23/Agpm
315				Pá Mecânica		PÁ MECÂNICA		0 hrs	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00
316				Empilhadeira		EMPILHADEIRA		0 hrs	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00
317				Carreta		CARRETA		0 hrs	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00
318				Comboio		CAMINHÃO COMBOIO		0 hrs	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00	20/08/25 00:00

Etapas da Linha de Base

Task

Baseline

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Rollad Up Task

Rollad Up Milestone

Baseline Summary

Rollad Up Baseline

Rollad Up Baseline Milestone

Rollad Up ProgTask

Progress

Baseline

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Tarefa Inativa

Etapa Inativa

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Progress

Rollad Up Task

█

█

█


█

█


█



## MAPA DE PARADAS PREVENTIVA – AGOSTO/2025 - 20/08/2025 a 22/08/2025

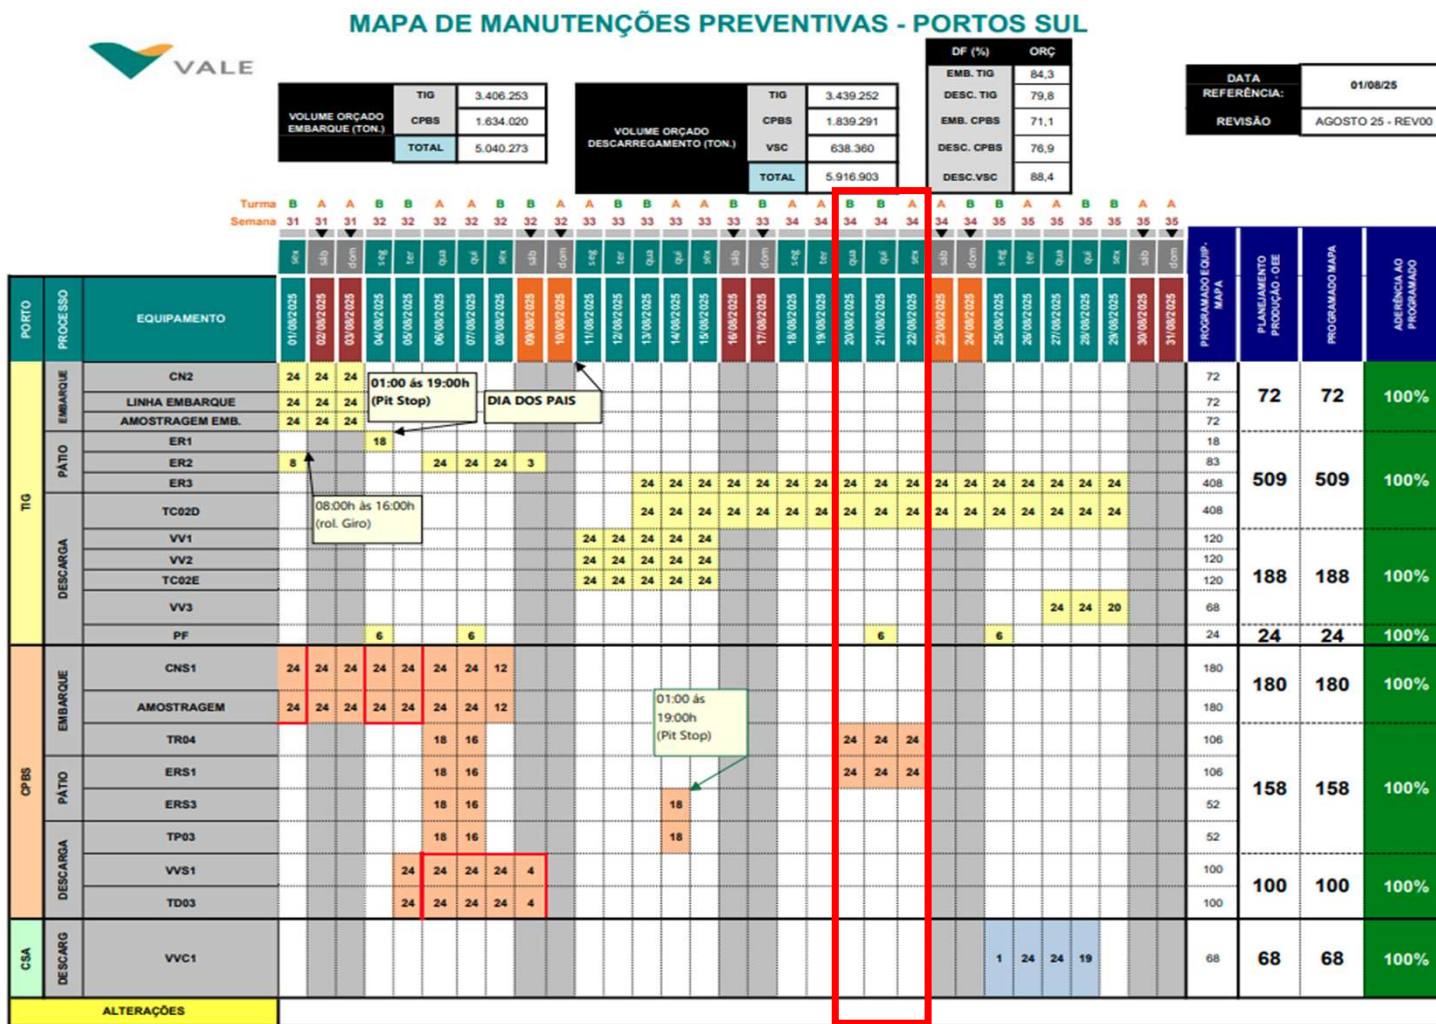

## PREVISÃO DE TEMPO

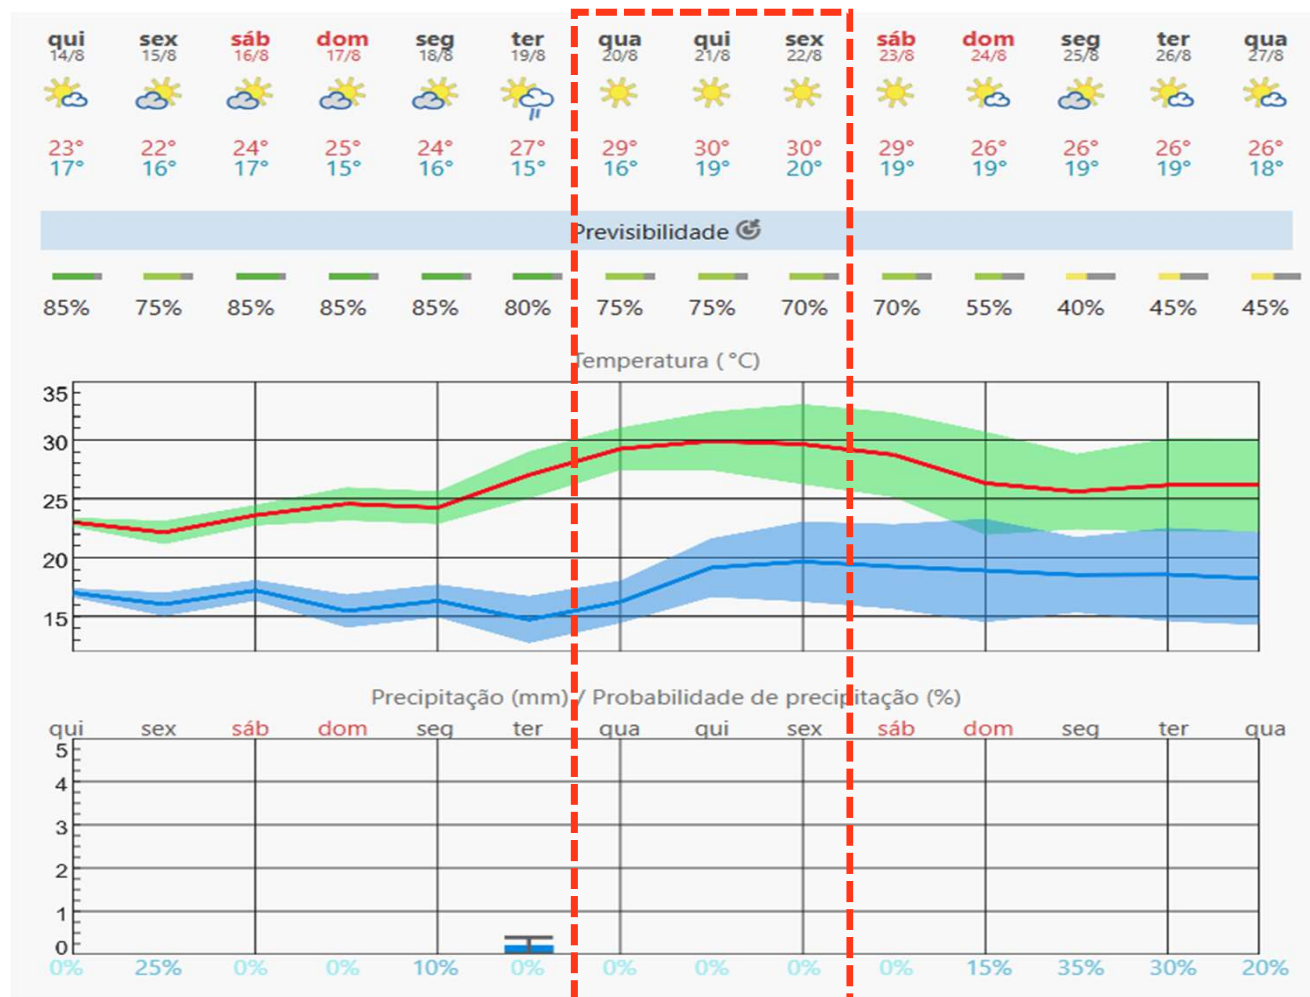

Fonte: [https://www.meteoblue.com/pt/tempo/14-dias/itagua%C3%AD\\_brasil\\_3460899](https://www.meteoblue.com/pt/tempo/14-dias/itagua%C3%AD_brasil_3460899)

## CADEIA DE AJUDA - RIP

### TURNO DIURNO – 07:30 à 18:30h

Acionar na ordem abaixo:

**Supervisão:**

Josmar: (21) 97378-9932

**Encarregado de Execução:**

David (21) 97080-0377

**Planejamento:**

Alex Cabral : (21) 96976-4882

Lilian Alves: (21) 96542-7970

Luis Gustavo: (24) 99818-0160

**SESMT:**

Filipe Magno: (21) 99679-8101

Baldomero: (21) 97276-7304

Julio: (21) 97276-7304

**Almoxarife:**

Charles Mota: (21) 99252-7425



### TURNO NOTURNO – 19:30 à 06:30h

Acionar na ordem abaixo:

**Supervisão:**

**Encarregado de Execução:**

Euler: (21) 97405-5945

**SESMT:**

Eloíza: (21) 96451-8542

**Almoxarife:**

Luan: (21) 97942-5751

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



## HISTOGRAMA

TURNO DIA		TURNO NOITE	
FUNÇÃO	QUANT	FUNÇÃO	QUANT
Eletricista	3	Eletricista	3
Enc. Mecânica	3	Enc. Mecânica	3
Enc. Andaime	1	Mont. And. Líder	0
Mec Montador	12	Mec Montador	10
Mont Andaime	5	Mont Andaime	3
Mot Op. Munck	1	Mot Op. Munck	1
Pintor	1	Pintor	1
Soldador	5	Soldador	4
Topografo	1	Topografo	0
Planejamento	3	Planejamento	0
Supervisor	1	Supervisor	1
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26</b>



## ESTRATÉGIA ADOTADA

1. Mobilização: **19/08/2025 – Terça-Feira**
2. Limpeza: **20/08 00:00h até 20/08 12:00h**
3. Bloqueio: **20/08/2025 – Quarta-feira 12:00h até 13:30h**
4. Estratégia de folga: N/A
5. Regime de turno: **24h**
6. Desbloqueio: **22/08/2025 – Sexta-feira 14:32h até 15:32h**
7. Desmobilização: **22/08/2025 – Sexta-feira 14:32h até 15:32h**



## RECURSOS ESPECIAL

DESCRIÇÃO	QUANT.
GUINDASTE (VALE)	1
EXAUSTOR	0
TORRE DE ILUMINAÇÃO	1
CAMINHÃO MUNCK	1
CAÇAMBA METÁLICA (VALE)	2
PTA (VALE)	0



## FERRAMENTAS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT.
MAQ. DE SOLDA	5
CONJ. OXICORTE	6
TALHA CATRACA	4
TALHA CORRENTE	4
TIFOR	2
MACACO HIDRÁULICO	2
LIXADEIRA	8
TORQUÍMETRO	2
GERADOR	1



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO




## HISTOGRAMA - INTEGRIDADE

TURNO DIA		TURNO NOITE	
FUNÇÃO	QUANT	FUNÇÃO	QUANT
Eletricista	2	Eletricista	1
Caldeireiro	2	Caldeireiro	0
Eletricista Lider	1	Eletricista Lider	0
Enc. Andaime	1	Mont. And. Líder	1
Enc. Mecânica	3	Enc. Mecânica	2
Mec Montador	14	Mec Montador	10
Meio Ambiente	0	Meio Ambiente	0
Meio Oficial And	2	Meio Oficial And	1
Meio Oficial Mec	4	Meio Oficial Mec	1
Mont Andaime	6	Mont Andaime	3
Mot Op. Munck	2	Mot Op. Munck	1
Pedreiro	2	Pedreiro	0
Pintor	2	Pintor	0
Planejamento	3	Planejamento	0
Soldador	7	Soldador	4
Supervisor Mec	2	Supervisor	0
Téc. Segurança	4	Téc. Segurança	0
Topografo	1	Topografo	0
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

## HISTOGRAMA - PINTURA

TURNO DIA		TURNO NOITE	
FUNÇÃO	QUANT	FUNÇÃO	QUANT
Eletricista	1	Eletricista	1
Ajud. Pintura	8	Enc. Pintura	1
Enc. Andaime	1	Jatista	4
Enc. Pintura	1	Líder Pintura	1
Inspetor Pintura	1	Mec Montador	0
Jatista	4	Meio Oficial	0
Líder Pintura	1	Mont Andaime	0
Mec Montador	1	Mont. And. Líder	0
Meio Ambiente	1	Mot Op. Munck	1
Meio Oficial And	4	Pintor	0
Mont Andaime	4	Planejamento	0
Mot Op. Munck	1	Supervisor	0
Pintor	10		
Planejamento	2		
Supervisor	1		
Téc. Segurança	1		
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>


## CANTEIRO AVANÇADO – ARRANJO FÍSICO

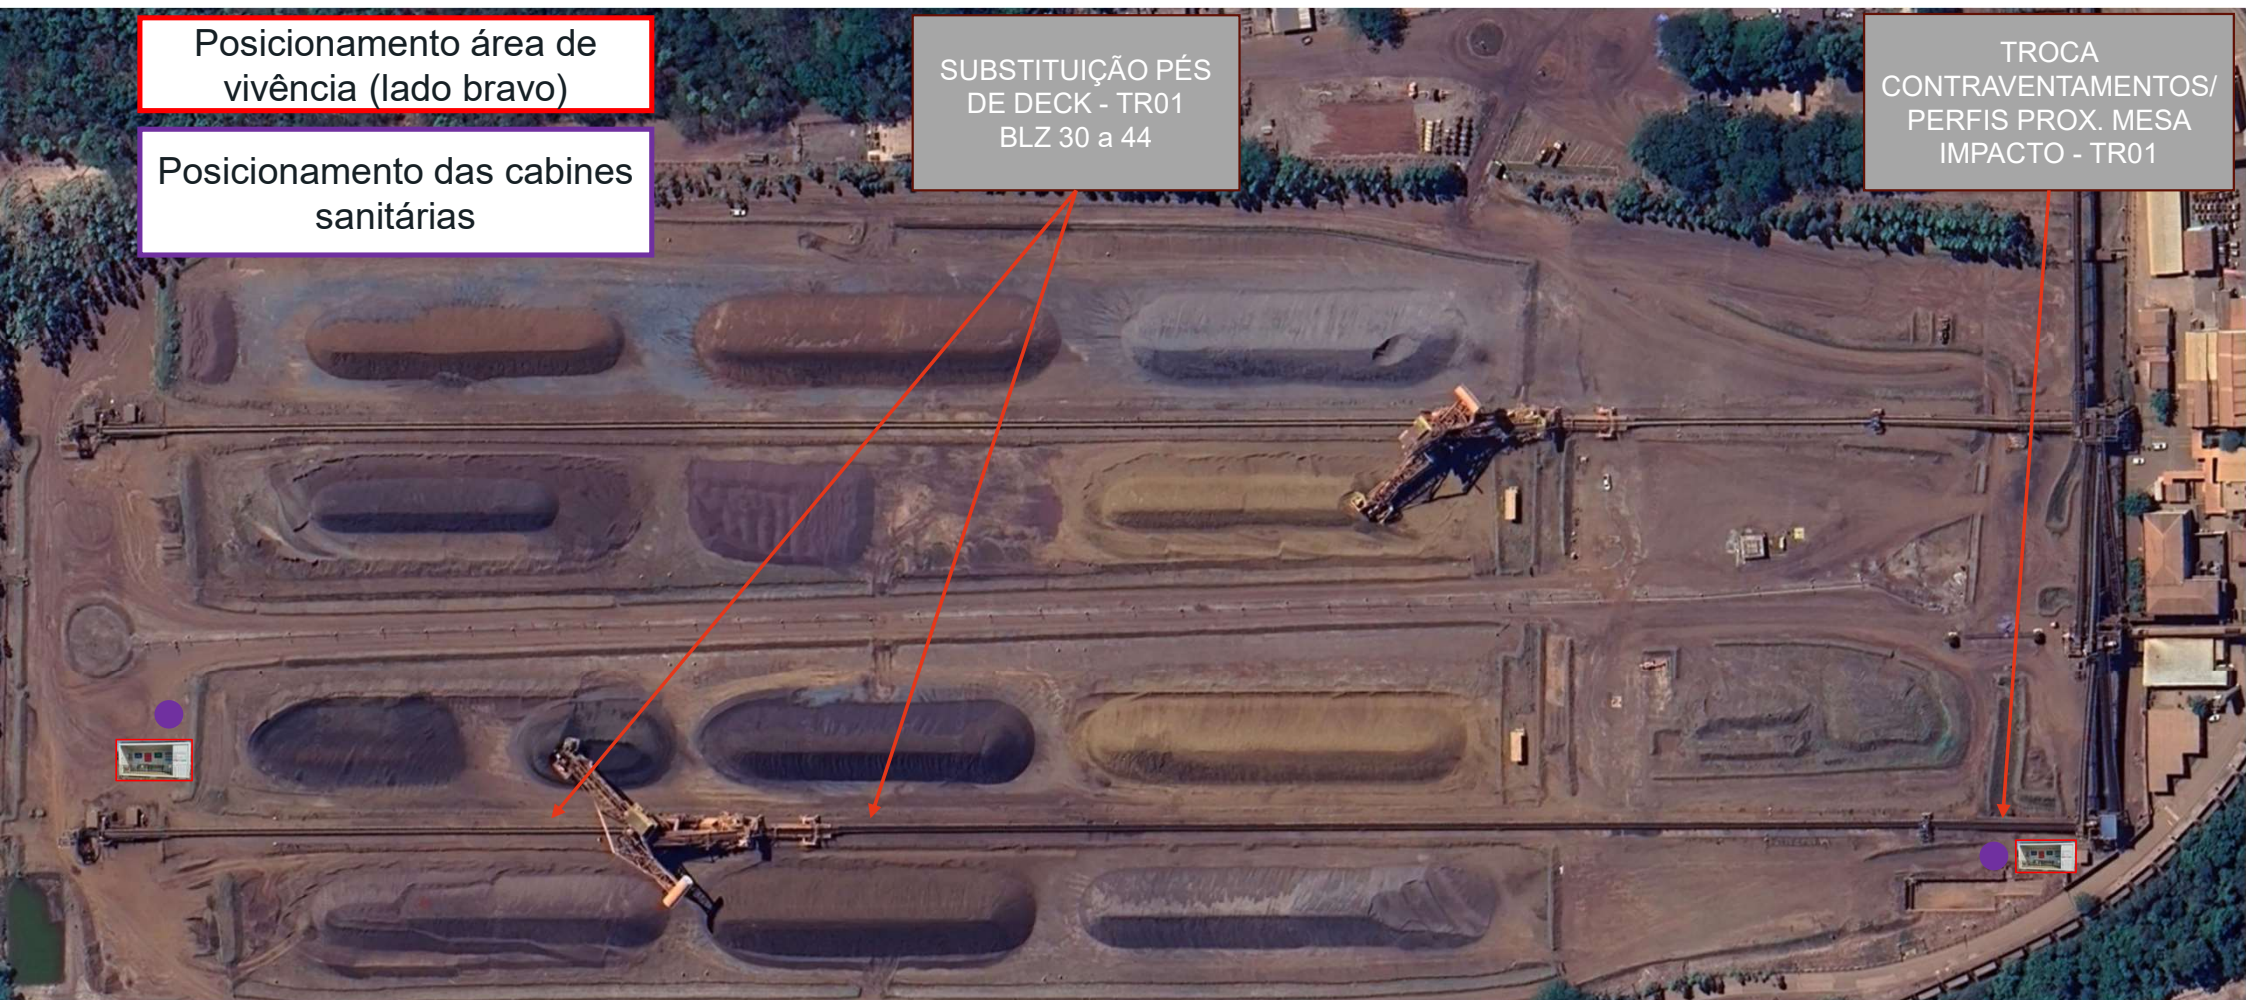

# SUBSTITUIÇÃO DOS PÉS DE DECK – TR01

## LOCAL: PÁTIO 1 – 07/07 a 11/07

Legenda	
Descrição	Cor
Concluído	

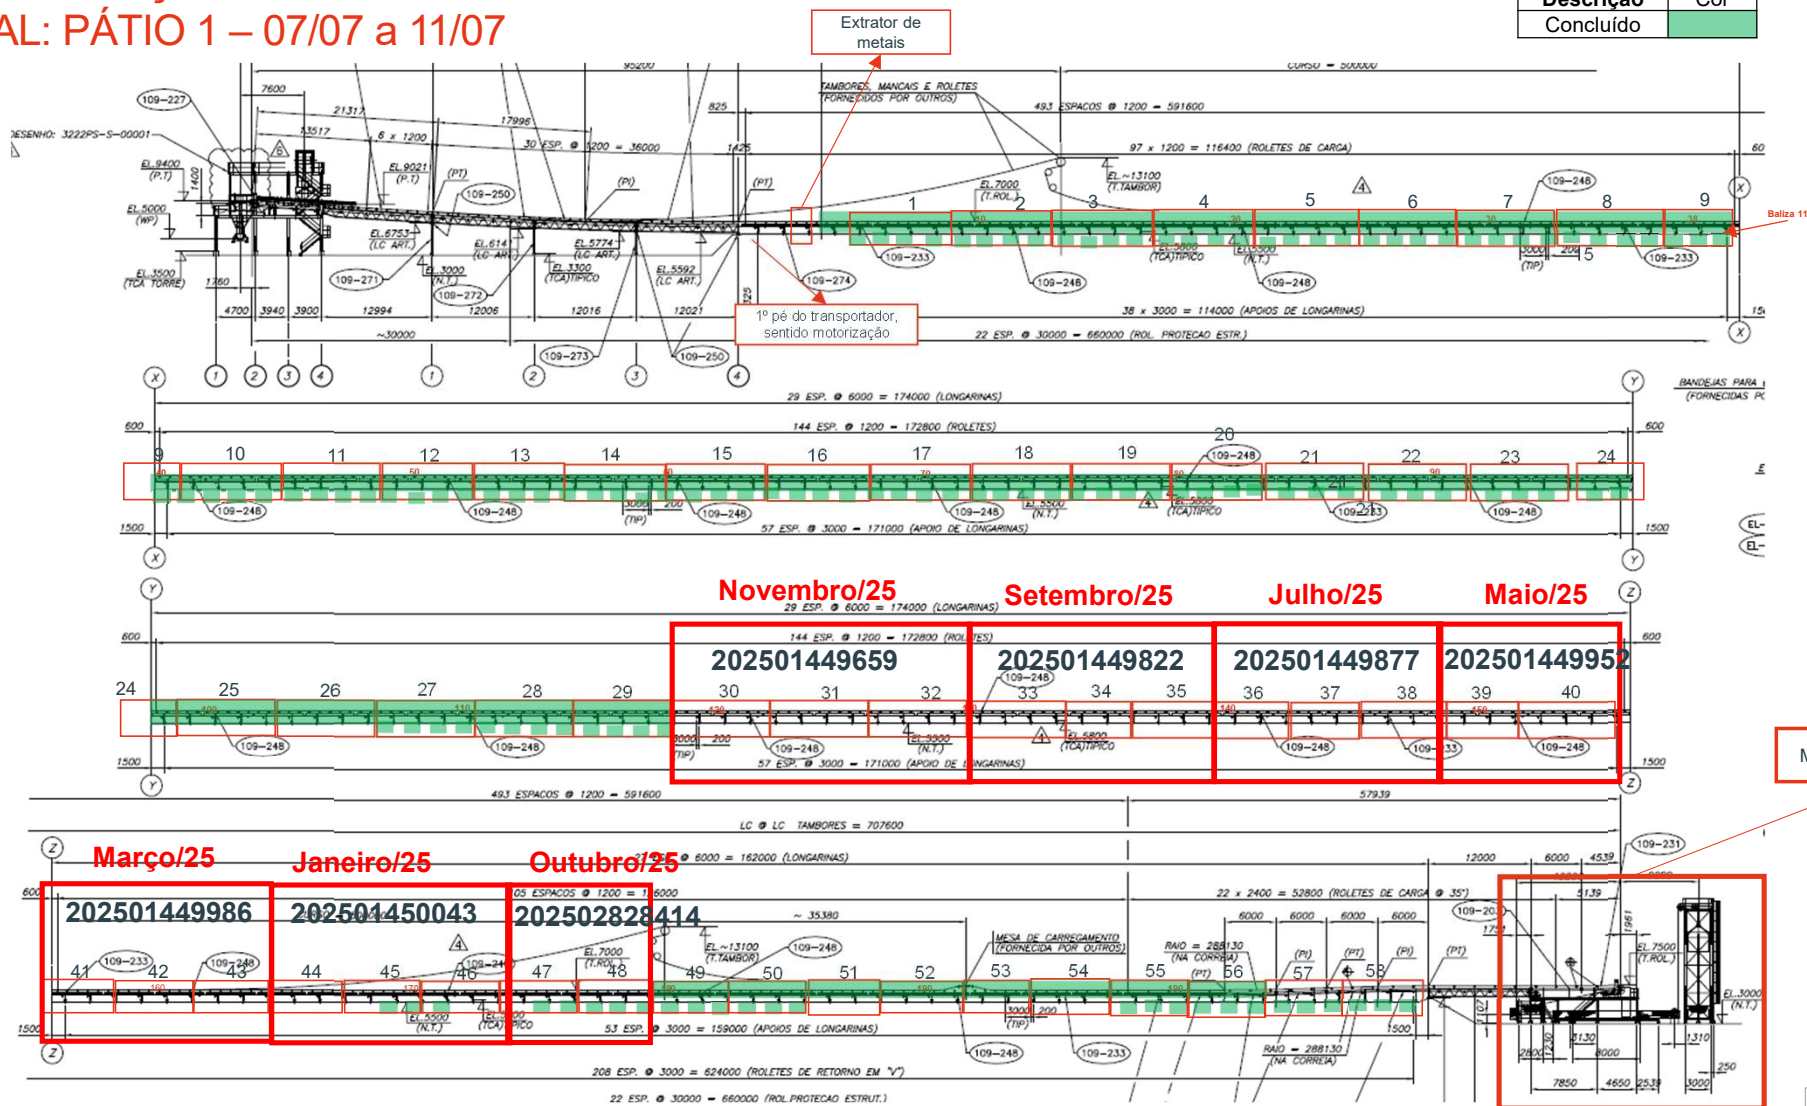



## SUBSTITUIÇÃO PÉS DE DECK - TR01 - BALIZA 30 A 45 – LADO BRAVO – PILHA ESTÁ ALTA





## SUBSTITUIÇÃO PÉS DE DECK - TR01 - BALIZA 45 A 48 – LADO ALFA – PILHA ESTÁ ALTA



## TROCA CONTRAVENTAMENTOS/PERFIS PROX. MESA IMPACTO – TR01

Local: Pátio 01

Carteira : 20 à 22.08.25 – 72h

**RANGE DE ATUAÇÃO**





## TROCA CONTRAVENTAMENTOS/PERFIS 2" E 2.1/2" PROX. MESA IMPACTO – TR01

Local: Pátio 01

Carteira : 20 à 22.08.25 – 72h

